

《現場紹介》


静岡県静岡市清水区
静浜幹線A-20工区

三河支店 佐藤 誠史

当現場はガス管を挿入する為の鞘管布設工事です。元請会社様の現場、ご担当者は以前、他現場で御世話になった方で、気がつけば施工班も以前と同じと懐かしくも新鮮な気分です。現場に臨む事が出来ました。駅及び漁港前の工事の為、限られた作業ヤード内に設備を配置する為に第三者に支障の無い様協議・養生するなど日数を費やし、ようやく推進作業に取り掛かれました。

当初の土質は砂質土が強いとの事で日進量の伸びを期待していましたが、実際は粘性土が強く、また推進距離が進むにつれて推力上昇の傾向が表れ、滑材注入による推力低減作業と我慢の日々を過ごしました。

その我慢の日々を耐えていた時に、地震が起きたという事もあり精度・及び推力の変化を危惧していましたが、表立った様な変化は無く元請様はじめ全員が胸を撫で下ろしました。施工班のその我慢強くかつ丁寧な作業の結果、低推力での到達につながったと思います。最後に、当現場工事を工程・安全管理共に支障なく進めることが出来たのも橋本所長はじめ施工班の協力のおかげです。有難う御座いました。

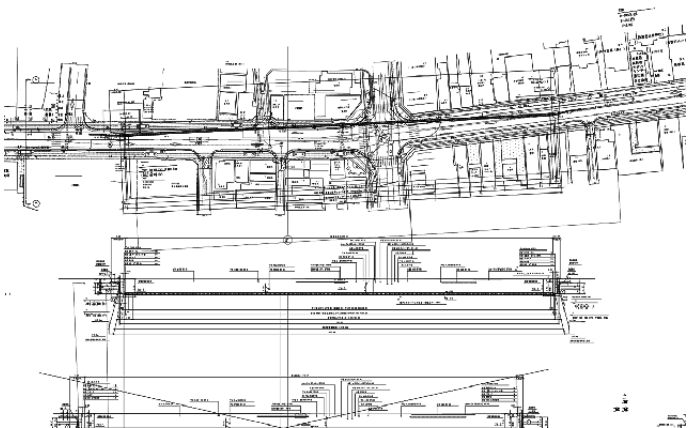

【工事概要】(敬称略)

発注者：静岡ガス(株)

元請会社：住友金属パイプエンジ(株)～鈴与建設(株)～地建興業(株)

工事内容：薬液注入工…注入量 13,944L

推進工…推進 $\phi 800 \times 186.51\text{m}$ 土質 砂質シルト

中込注入工…一式
